


**T.C.**  
**ANKARA SOSYAL BİLİMLER**  
**ÜNİVERSİTESİ**

**2016 YILI YATIRIM PROGRAMI**  
**İZLEME VE DEĞERLENDİRME**  
**RAPORU**

---



**T.C.  
ANKARA SOSYAL BİLİMLER  
ÜNİVERSİTESİ**

**2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE  
DEĞERLENDİRME RAPORU**

**HAZIRLAYAN  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**

## İÇİNDEKİLER

Yönetici Özeti.....	3
1.GENEL DEĞERLENDİRME .....	4-14
A.MİSYON, VİZYON .....	4
B.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER. ....	4
C. ÜNİVERSİTEMİZ TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİ.....	5-6
D. ÜNİVERSİTEMİZ TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ.....	7
1.1 . ÜNİVERSİTEMİZ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	8-12
1.1.1. Yatırımlarının Finansman Kaynaklarının Yasal Dayanakları .....	8
1.1.2. Üniversitemiz 2016 Yılı Sermaye Giderleri Ödenek Dağılımları ve Oranları.....	9
1.1.3. 2016 Yılı Bütçe Ödenekleri ve Harcama Tablosu .....	10
1.1.4. 2015-2016 Yılları Yatırım Gerçekleşme Tablosu.....	11
1.2. ÜNİVERSİTEMİZ MEVCUT ÜRETİM/HİZMET KAPASİTESİ .....	12
1.3. ÜNİVERSİTEMİZ 2016 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI/İYİLEŞTİRME .....	12-13
1.4. ÜNİVERSİTEMİZ 2016 YILI YATIRIM UYGULAMALARI .....	14
2. ÜNİVERSİTEMİZ 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	15-25
2.1. Üniversitemiz Devam Eden Projeler .....	15
2.1.1. Kamu Yatırım Projeleri .....	15-18
2.2 Üniversitemiz 2016 Yılı Tamamlanan Projeleri.....	19-21
2.2.1. Tamamlanan Projelerin Listesi .....	19
2.2.2. Proje Tamamlanma Raporu .....	22-24
3. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİ..	25
EKLER.....	26-27
EK-1. 2016 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu .....	26
EK-2. 2016 Yılı Yatırım Programı Tablosu .....	27

## YÖNETİCİ ÖZETİ



Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi insanlığın refahını artırmayı ve sorun çözmeyi önceleyen araştırmalar yaparak sonuçlarını uygulamaya dönüştürmeyi, girişimci, kendini sürekli geliştiren, sorumluluk sahibi, meslekî ve akademik alanda yetkin bireyler yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir.

Üniversitemiz bu temel amacına ulaşmak için en son teknolojideki makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim ve öğretim verebilmek üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya çalışmaktadır.

31 Ocak 2013 Tarihli ve 28545 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak kurulan Üniversitemiz kısa sürede 5 Fakülte, 5 Enstitü ve 7 Merkez olarak 142 akademik personel, 99 idari personele ulaşarak hızlı bir gelişim ve büyüme göstermiştir. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi devlet üniversitesi olarak emin adımlarla ilerleyen üniversitemiz misyon ve vizyonuna uygun olarak faaliyet göstermektedir.

Üniversitemizin 2016 Yılı Yatırım Programında toplam 7 adet yatırım projesi mevcut olup, bu projeler için 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 29.700.000 TL ödenek ayrılmıştır. Tüm harcamaların ayrıntıları ve daha fazlası raporun içerisinde yer almaktadır.

Bu bağlamda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi uyarınca hazırlanmış olduğumuz Üniversitemizin 2016 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu ekte sunulmuş olup, yapılan bu yatırımların Üniversitemize ve bölgemize faydalı olması dileğiyle çalışmalarda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.

Prof. Dr. Mehmet BARCA  
Rektör

## **1-GENEL DEĞERLENDİRME**

### **A- MİSYON, VİZYON**

#### **Misyonumuz**

Üniversitemiz, sosyal bilimler alanında yapacağı arařtırmalarla ülkenin geleceğine ışık tutmayı ve arařtırma evrenine katkıda bulunmayı, arařtırma, eđitim ve hizmet alanındaki üretimini toplum yararına sunmayı amaçlamaktadır.

#### **Vizyonumuz**

Sosyal bilimler alanında arařtırma, yayım, öğretim ve danışmanlık hizmetlerine odaklanan, bu alanda uluslararası işbirliğine önem veren, güvenilir, yenilikçi uluslararası saygın bir üniversite olmak.

### **B- İDAREYE İLİŐKİN BİLGİLER**

31 Ocak 2013 Tarihli ve 28545 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak kurulan Üniversitemiz kısa sürede 5 Fakülte, 5 Enstitü ve 7 Merkez, 142 akademik personel, 99 idari personele ulařarak hızlı bir gelişim ve büyüme göstermiştir. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi devlet üniversitesi olarak emin adımlarla ilerleyen üniversitemiz, misyon ve vizyonuna uygun olarak faaliyet göstermektedir.

Üniversitemiz bu temel amacına ulaşmak için en son teknolojiye makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim ve öğretim verebilmek üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya çalışmaktadır.

Ayrıca 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde Hazineye devredilmesine karar verilen Turan Güneş Bulvarı, 648. Cadde 651 Sokak , No:4 Oran, Çankaya, Ankara adresindeki İpek Üniversitesi kampüsünün kullanımı 31.07.2016 tarih itibariyle Üniversitemize devredilmiş, ilgili kurum bünyesindeki sağlık uygulama ve arařtırma merkezleri haricinde eğitim öğretim ve diđer hizmetlerin tümünün tarafımızdan yürütülmesine karar verilmiştir.

## C- ÜNİVERSİTEMİZ TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER

Çağdaş eğitim ve öğretim uygulamalarını izlemek, ülkemizin çağdaş uygarlık ve teknolojik gelişim düzeyini yakalayabilmesini sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak ve bu araştırmalar sonucunda uygulanabilir yeni projeler üretmek,

Eğitim ve öğretimde verimlilik ve kaliteyi arttırmak, üniversitenin araştırma ve eğitim stratejisini geliştirerek geleceğe yönelik araştırma alanları belirlemek,

Üniversitenin finansman kaynaklarını geliştirmek ve gelirlerini arttırarak elde edilen gelirlerden yatırımlar ve projelere daha fazla kaynak sağlamak,

Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip, milli kültürü ve tarihi özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen bilgi toplumu insanını yetiştirmek,

Her türlü düşünceye açık, aklın egemen olduğu özgür bir ortamda bilgiye ulaşan, bilginin kullanıldığı, bilginin üretildiği, yaratıcı ve katılımcı bir üniversite ortaya çıkarmak olan ve sorgulayan, araştıran, çözüm üreten, sosyal becerileri gelişmiş, kendine güvenen, doğru kararlar verebilen, akılcı, yaratıcı, üretken, insan haklarına saygılı evrensel değerlere açık, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı gençler yetiştirmek,

İdari faaliyetlerimizde ve bütçemizin hazırlık ve uygulamasında; Yüksek Öğretim Stratejisi, Kalkınma Planları, Yıllık Programlar, Orta Vadeli Programlar, Orta Vadeli Mali Planlar, Bilgi Toplumu Stratejisi ve eki Eylem Planı ile diğer mevzuatlarda belirlenen usul ve esaslara titizlikle uymak,

Bilimsel standartlar konusunda uluslararası normları yakalamak ve geçmek,

İdari ve Akademik Yönetimin Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak düzenli ve etkili bir şekilde işlemlerini,

Kalkınma plan ve programları ile Hükümet programının etkili bir şekilde uygulanması, idarenin etki ve verimliliğinin artırılması amacıyla yeniden yapılandırılmasını, idari iş ve işlemlerin sadeleştirilmesi ve kalitesinin artırılması yoluyla öğrenci ve diğer hizmet talep edenlerin hayatının kolaylaştırılmasını, tasarruf kültürünün yaygınlaştırılmasını, idarede stratejik yönetim ve performans yönetimi anlayışının ve etkili bir denetim sisteminin geliştirilmesi sağlamak, Üniversitemizin temel politikaları ve öncelikleridir.

Bu çerçevede;

- ✓ Kişilerin fiziksel, sosyal, zihinsel ve ruhsal gelişimlerinde önemli bir payı olan eğitim yaygınlaştırılacaktır.



- ✓ Eğitim kalitesinin artırılması amacıyla yenilikçiliği, araştırmayı, takım çalışmasını, özgün ve girişimci düşünmeyi esas alan müfredat değişiklikleri yapılacak ve bu kapsamda eğitimciler ile yöneticilerin eğitimi gerçekleştirilecektir.
- ✓ Kişilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunan ve hayata hazırlayan etkin bir rehberlik ve yönlendirme sistemi geliştirilecektir.
- ✓ Eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılacak ve etkin hale getirilecektir.
- ✓ Üniversitemizde, idari ve mali özerklikleri sağlanarak ihtisaslaşmayı esas alan rekabetçi bir yapının oluşturulması teşvik edilecektir.
- ✓ Üniversitemizde hizmet üreterek kaynak oluşturma faaliyetleri desteklenecek, öğrencilerin eğitimin finansmanına daha fazla katılımı sağlanacaktır.
- ✓ Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişim, katılımcılık, saydamlık, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik, yerindelik, beyana güvenine özen gösterilecektir.
- ✓ Eğitim programlarının sürekli gözden geçirilmesiyle güncelleştirilmesi sağlanacaktır.
- ✓ Fakülte ve Enstitülerin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyon, insan kaynağı, sistem ve süreçleri sürekli gözden geçirilecektir.

### **Diğer Hususlar**

Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri ile temel politikaları ve önceliklerinin yanında;

- ✓ Hızla üretilen yeni bilgilerin ve oluşan yeni bilgi alanlarının tümünü kapsayacak şekilde programlarını genişletmek,
- ✓ Eğitimde, mezunların iş bulabilmesi, araştırmada ise bilginin yanı sıra uygulamaya yönelmek,
- ✓ Toplumla güçlü köprüler kurarak, bölgesel ve ulusal kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmak,
- ✓ Paydaşlarına hesap verebilen, açık ve saydam yönetim modelleri geliştirmek, gibi beklentileri karşılamaya yönelik politikaları da vardır.

## D- ÜNİVERSİTEMİZ TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ

Amaçlar		Hedefler	
1.	Ulusal ve uluslararası alanda eğitimde rekabet etmek	1.1.	Yürütülmekte olan programların niteliklerinin ulusal ve uluslararası normlara ve beklentilere göre güncellenmesi ve sürdürülmesi
		1.2.	Ulusal ve uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği sağlayan programların ve programa dâhil olacak öğrenci ve öğretim elemanı sayılarının artırılması
		1.3.	Öğrencilerde girişimcilik bilincinin geliştirilmesi ve bu yöndeki uygulamaların sürdürülmesi
		1.4.	Öğrencilere yönelik beslenme, sağlık, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulması ve bu alanlardaki olanakların artırılması
2.	Kurumun Fiziki Altyapısını Oluşturmak, Geliştirmek ve İyileştirmek	2.1.	Eğitim öğretim alt yapısının oluşturulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
		2.2.	<i>Akademik ve idari hizmet birimlerinin her türlü mal ve hizmet alımının (Büro malzemesi, makine, taşıt, cihaz ve teçhizat, güvenlik ve temizlik vb.) temini ve yeni binaların tefriş edilmesi</i>
		2.3.	Sosyal ve spor alanlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
		2.4.	İdari hizmet alanlarının alt yapısının oluşturulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
3.	Ulusal ve Uluslararası Araştırma Olanaklarını Artırmak ve Ar-Ge Çalışmalarını Teşvik Etmek	3.1.	Araştırma olanaklarını arttırmak için insan kaynağının geliştirilmesi
		3.2.	Ulusal ve uluslararası proje ve yayın sayısının artırılması
4.	Kurumsal Yapının Sürdürülebilirliğini ve Gelişimini Sağlamak	4.1.	Ulusal ve uluslararası iletişim ve işbirliği ağlarının artırılması
		4.2.	Üniversitenin tanıtımı için ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım çalışmalarının ve etkinliklerinin artırılması
		4.3.	Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi
		4.4.	Akademik ve idari personelin gelişiminde sürekliliğin sağlanması
		4.5.	Beşeri kaynakların niceliğinin artırılması
5.	Paydaşlarla Etkileşim Kalitesini Arttırmak	5.1.	Paydaşlarla iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi
		5.2.	Mevcut kapasite ile eğitim-araştırma sonuçlarından elde edilecek birikimin topluma yönelik ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi
		5.3.	Mezunlarla sürekli iletişimi sağlamak



## 1.1. ÜNİVERSİTESİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun' a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, “Özel Bütçe” li bir kurumdur.

Gelirlerimiz :

### A) Özel Bütçe

- a) Hazine Yardımı
- b) Öz Gelirler
  - Kira Gelirleri

### B) Bütçe Dışı Kaynak

- a) TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Proje Destekleri
- b) AB (Avrupa Birliği) Proje Destekleri
- c) Diğer

### 1.1.1. Yatırımlarının Finansman Kaynaklarının Yasal Dayanakları

VERGİ, RESİM VE DİĞER GELİRLERİN DAYANAKLARI			ÖZET
ÇEŞİDİ	TARİHİ	NUMARASI	
KANUN	04.11.1981	2547	Yükseköğretim Kanunu
KANUN	19.11.1982	3843	Yükseköğretim Kurumlarında ikili öğretim yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
KANUN	10.12.2003	5018	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
KANUN	28.07.1953	6183	Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun


### 1.1.2. Üniversitemiz 2016 yılı (06) Sermaye Giderleri ödenek Dağılımları ve Oranları

2016 Yılı yatırım bütçemizin başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 1: 2016 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımı**

2016 YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI							
(06 - Sermaye Giderleri )							
KOD	AÇIKLAMA	KBÖ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	2016 YIL SONU ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMA	HARCAMA (%)
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	5.450.000	0	0	5.450.000	1.142.899	20
06.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	550.000	0	0	550.000	460.920	83
06.4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	18.800.000	0	18.800.000	1.944.336	10
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	8.400.000	4.886.900	6.000.000	7.286.900	1.474.930	20
06.6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	390.000	0	390.000	128.131	32
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	15.300.000	11.931.987	0	27.231.987	27.224.793	99
<b>06</b>	<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>29.700.000</b>	<b>36.008.887</b>	<b>6.000.000</b>	<b>59.708.887</b>	<b>32.376.009</b>	<b>54</b>

**Grafik 1: 2016 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımları**

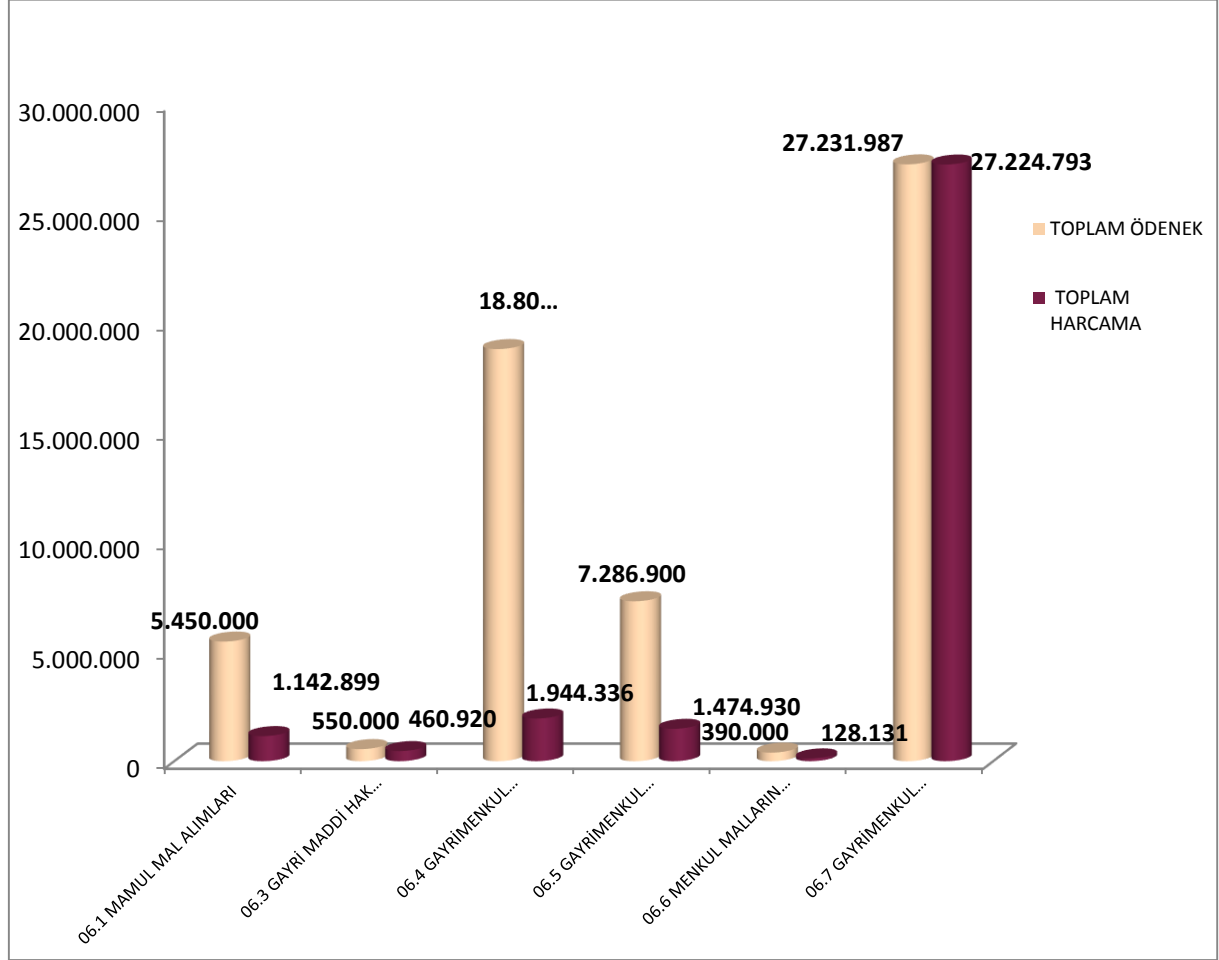


### 1.1.3. 2016 Yılı Bütçe Ödenekleri ve Harcama Tablosu

**Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre ÖdeneK ve Harcama Miktarı Dağılımı**

EKO. KOD.	AÇIKLAMA	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	KALAN
01	Personel Giderleri	7.616.000	4.790.685	1.954.200	10.452.485	10.452.485	10.312.617	36.867
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet P. Giderleri	1.060.000	709.625	264.625	1.505.0000	1.505.000	1.499.014	5.986
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.436.000	4.141.993	0	11.577.993	11.577.993	8.925.493	2.652.500
05	Cari Transferler	569.000	0	0	569.000	569.000	246.630	322.370
06	Sermaye Giderleri	29.700.000	36.008.887	6.000.000	59.708.887	59.708.887	32.376.009	27.332.878
<b>TOPLAM</b>		<b>46.381.000</b>	<b>45.651.190</b>	<b>8.218.825</b>	<b>833.813.365</b>	<b>83.813.365</b>	<b>53.359.762</b>	<b>30.350.603</b>

## Sermaye Giderlerinin Toplam Giderler İçindeki Payı (%)



Yukarıdaki tablo 2 de Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama miktarları verilmiştir.

Yandaki tablodan da anlaşılacağı üzere toplam bütçe giderlerinin % 60'ını Sermaye Giderleri oluşturmaktadır.


Aşağıdaki tabloda proje bazında 2015 ve 2016 yılı bütçe başlangıç ödenekleri, harcama ve gerçekleştirme oranları verilmiş olup, 2016 yılında harcama miktarı ile gerçekleştirme oranının arttığı görülmektedir.

### 1.1.4. 2015-2016 Yılları Yatırım Gerçekleşme Tablosu

Tablo 3: 2015-2016 Yatırım Gerçekleşme Tablosu

Projenin Adı	2015 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMU			2016 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMU		
	2015 Yılı Toplam Ödenek	2015 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)	2016 Yılı Toplam Ödenek	2016 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000	0	0	200.000	175.820	87
Kampüs Altyapısı	300.000	0	0	600.000	0	0
Derslik ve Merkezi Birimler	998.000	0	0	1.998.000	0	0
Muhtelif İşler	7.300.000	1.378.000	19	10.610.000	7.013.000	66
Yayın Alımı	2.500.000	2.105.720	84	1.300.000	499.700	38
<b>EĞİTİM SEKTÖRÜ</b>	<b>11.198.000</b>	<b>3.483.720</b>	<b>31</b>	<b>14.700.000</b>	<b>7.688.520</b>	<b>52</b>
Muhtelif Etüd Proje İşleri	4.000.000	511.100	12	4.488.900	1.299.110	27
Tarihi Binaların Restorasyonu	14.000.000	12.678.010	90	21.322.000	21.316.000	100
<b>KÜLTÜR SEKTÖRÜ</b>	<b>18.000.000</b>	<b>13.189.110</b>	<b>73</b>	<b>25.810.900</b>	<b>22.615.110</b>	<b>88</b>
<b>YATIRIM HARCAMA TOPLAMI</b>	<b>29.198.000</b>	<b>16.672.830</b>	<b>57</b>	<b>40.510.900</b>	<b>30.303.630</b>	<b>77</b>

**Grafik 2: 2015-2016 Yatırım Harcama Miktarı Dağılımı**

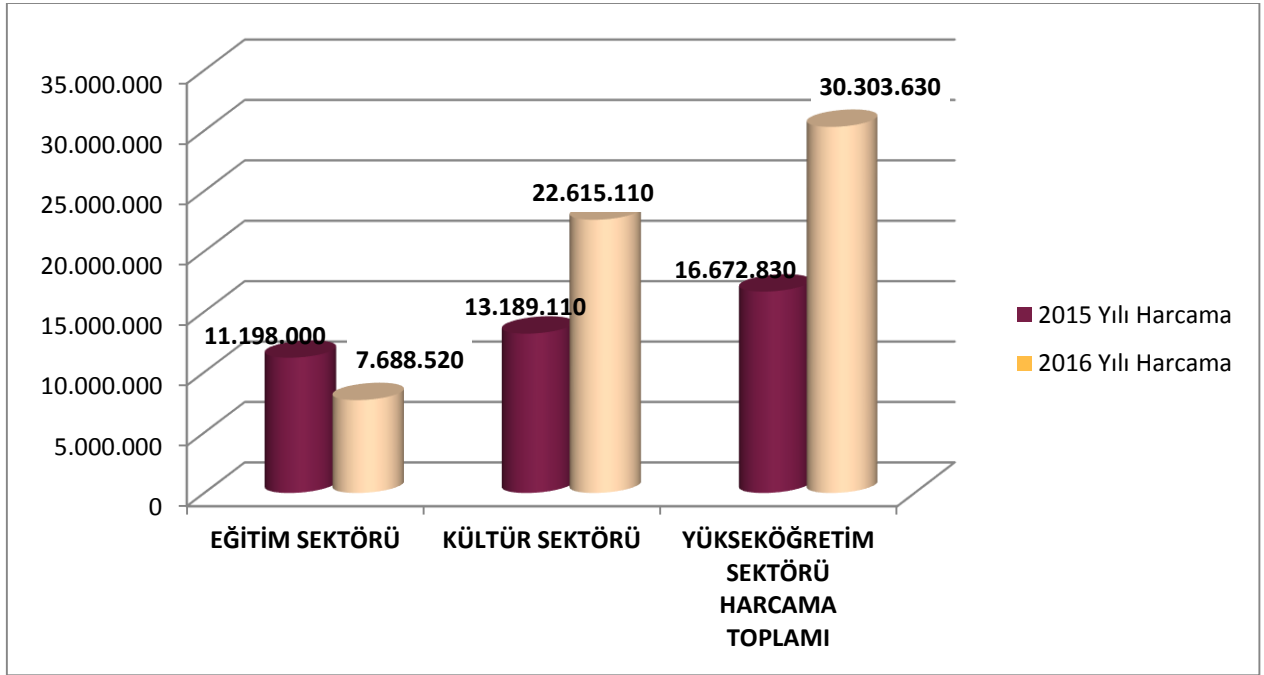

Üniversitemiz 2015 yılında Yükseköğretim sektöründe toplam 16.672.830 TL. harcama yapılmış olup 2016 yılında ise bu sektördeki harcama miktarı % 81 artarak 30.303.630 TL. olmuştur.

## **1.2. ÜNİVERSİTEMİZ MEVCUT ÜRETİM/HİZMET KAPASİTESİ**

2016 yılında 5 Fakülte, 5 Enstitü, 7 Merkez, 9 Daire Başkanlığı, 9 adet Koordinatörlük kapasitesine ulaşan Üniversitemiz, 241 akademik ve idari personeli bulunmakta olup Hizmet amacıyla 5 adet otomobil, 1 adet transit, 1 adet pick-up ve 1 adet otobüs kullanılmaktadır. Enstitülerimizde lisansüstü eğitimi, Fakültelerimizde de lisans eğitimi verilmektedir.

2016 yılında mevcut kapasitemiz tablo 4 de gösterilmiştir

## **1.3. ÜNİVERSİTEMİZ 2016 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI/KALİTE ARTIŞI /İYİLEŞME**

İlk kuruluş yılımız olan 2013 yılında 23.235 m<sup>2</sup> kapalı alanımızda içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren üniversitemizde 2016 yılı itibariyle yaklaşık 31.807 m<sup>2</sup>'lik artış ile bu rakam 55.042 m<sup>2</sup>'ye ulaşmıştır. 2016-2017eğitim-öğretim yılında 667 KHK ile kapatılan İpek Üniversitesi öğrencilerine de Üniversitemiz eğitim ve öğretim faaliyetleri vermektedir.

**Tablo 4: Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi**

Yerleşke Adı	Mülkiyetin Durumuna Göre Taşınmaz Alanı			ASBÜ Adına Kullanılan Alan	Kapalı Alan	Açık Alan
	Ada/Parsel	Yüzölçüm	Kullanım Durumu			
Defterdarlık (Geçici Rektörlük Binası)	2576/3	7.090 m <sup>2</sup>	Aktif olarak kullanılmaktadır.	4.779 m <sup>2</sup>	13.560 m <sup>2</sup>	3.700 m <sup>2</sup>
Hacı Bayram Fevzipaşa (Lale Palas Yanı Garaj)	6099/18-19-20	1.006 m <sup>2</sup>	Restorasyon yüklenici firması tarafından şantiye olarak kullanılmaktadır.	***	800 m <sup>2</sup>	620 m <sup>2</sup>
Demirfırka Mahallesi (Konak)	484/6	303 m <sup>2</sup>	Yapılan bir çalışma bulunmamaktadır, kullanım amacı planlanmaktadır.	***	565 m <sup>2</sup>	58 m <sup>2</sup>
M Blok (Eski MAYEM)	2720/52	3.725 m <sup>2</sup>	Restorasyon yapılıyor.	***	3000 m <sup>2</sup>	2.950 m <sup>2</sup>
Hacı Bayram Fevzipaşa (Hükümet Konağı)	796/4	7.706 m <sup>2</sup>	Restorasyon yapılıyor.	***	22.435 m <sup>2</sup>	4500 m <sup>2</sup>
B Blok (Eski Sümerbank)	6101/1	1.980 m <sup>2</sup>	Restorasyon yapılması için proje çizimleri yapılıyor.	***	10.140 m <sup>2</sup>	***
Tarihi Tescilli Bina, Çankırı Cad. No:10	6099/6	265 m <sup>2</sup>	10.12.2015 Tarihinde teslim alındı, Adanın tümü için planlama olduğundan bu parsel için yapılan bir çalışma bulunmamaktadır.	***	926 m <sup>2</sup>	***
D Blok (Eski DÖSİMM)	2720/52	1477 m <sup>2</sup>	Üniversitemize ait Dini İlimler Fak., YİTDB birimi ve okutman odaları olarak kullanılmaktadır.	2602 m <sup>2</sup>	2602 m <sup>2</sup>	***
Çankırı Cad. No:10 (Eski Fatih Otel)	6099/7	231 m <sup>2</sup>	Teslim alındı, Adanın tümü için planlama olduğundan, bu parsel için yapılan bir çalışma bulunmamaktadır.	***	886 m <sup>2</sup>	***
Eski Çinçin Minibüs Durağı	6099/21	538 m <sup>2</sup>	Teslim alındı, Adanın tümü için planlama olduğundan, yapılan bir çalışma bulunmamaktadır.	***	***	538 m <sup>2</sup>
Kıraner İşhanı (Çankırı cad. No:14)	6099/16	128 m <sup>2</sup>	1 Bağımsız bölüm kamulaştırıldı. Kalan bölümlerin mahkeme süreci devam etmektedir.	***	128 m <sup>2</sup>	***
TOPLAM		24.449 m <sup>2</sup>		7.381 m <sup>2</sup>	55.042 m <sup>2</sup>	12.366 m <sup>2</sup>

Not: 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kapatılan vakıf üniversitelerinden (Eski İpek Üniv.) devredilen yerleşkeye ait veriler çizelgede bulunmamaktadır.



## 1.4. ÜNİVERSİTESİTEMİZ 2016 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

### Genel Yatırım Uygulama Durumu

Tablo 5: Yatırım Projeleri Dağılım Tablosu

Sıra No	Sektörün Adı	Proje No	Projenin Adı	Proje Yeri	İşin Başlama-Bitiş Tarihi	Proje Tutarı	Program Yılına Kadar Yapılan Harcama	Program Yılı Ödeneği	Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama		Proje Genelinde Fiziki Gerçekleşme
									Miktarı	%	
1	Yükseköğretim	2016H031360	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Ankara	2016-2016	200.000	0	200.000	175.820	87	87
2	Yükseköğretim	2015H031120	Kampüs Altyapısı	Ankara	2015-2017	2.500.000	0	600.000	0	0	0
3	Yükseköğretim	2015H030380	Derslik ve Merkezi Birimler	Ankara	2015-2017	20.000.000	0	1.998.000	0	0	0
4	Yükseköğretim	2016H031370	Muhtelif İşler (B.On.-Tad.-Mak.Teç.-Bil.Don. Alt.Bak.On.id .Yen.-Yaz.AL.)	Ankara	2016-2016	10.610.000		10.610.000	7.013.000	66	66
5	Yükseköğretim	2016H031380	Yayın Alımı	Ankara	2016-2016	1.300.000		1.300.000	499.700	38	38
<b>YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ TOPLAMI</b>						<b>34.610.000</b>	<b>0</b>	<b>14.708.000</b>	<b>7.688.520</b>	<b>52</b>	<b>22</b>
6	Yükseköğretim Kültür	2014H040000	Muhtelif Etüd Proje İşleri	Ankara	2014-2017	5.000.000	511.100	4.488.900	1.299.110	27	36
7	Yükseköğretim Kültür	2014H040010	Tarihi Binaların Restorasyonu	Ankara	2014-2017	72.000.000	12.678.000	21.322.000	21.316.000	100	47
<b>YÜKSEKÖĞRETİM KÜLTÜR SEKTÖRÜ TOPLAMI</b>						<b>77.000.000</b>	<b>13.189.100</b>	<b>25.810.900</b>	<b>22.615.110</b>	<b>88</b>	<b>46</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>						<b>111.610.000</b>	<b>13.189.100</b>	<b>40.518.900</b>	<b>30.303.630</b>	<b>75</b>	<b>38</b>


- 2016 yılında üniversitemiz yatırım projeleri için toplam 40.518.900 TL. ödenek tahsis edilmiş olup bu miktarın 30.303.630 TL.sı harcanmıştır.

## 2. 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI

### 2.1. ÜNİVERSİTESİTEMİZ DEVAM EDEN PROJELER:

#### 2.1.1. KAMU YATIRIM PROJELERİ


Proje No	: 2015H031120
Sektörü	: YÜKSEKÖĞRETİM
Proje Adı Özellikleri	: KAMPÜS ALTYAPISI;
Proje Yeri	: ANKARA
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2015-2017
Proje Tutarı	: 2.500.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	: 0 TL.
2016 Yılı Ödeneği	: 600,000 TL.
2016 Yılı Sonuna Kadar	
Yapılan Toplam Harcama	: 0 TL.
Fiziki Gerçekleşme	: % 0
Nakdi Gerçekleşme	: % 0

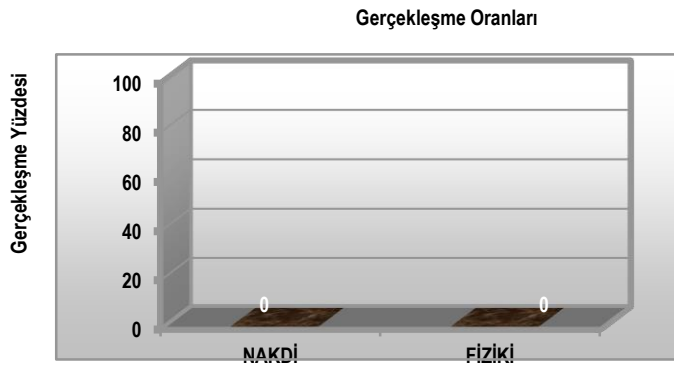

Grafik 4: Kampüs Altyapısı Projesinin Nakdi ve Fiziki Gerçekleşmesi

**Proje No** : 2015H030380  
**Sektörü** : YÜKSEKÖĞRETİM  
**Proje Adı Özellikleri** : DERSLİK ve MERKEZİ BİRİMLER;

Proje Yeri : ANKARA  
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2015-2017  
Proje Tutarı : 20.000.000 TL.  
Önceki Yıllar Harcaması : 0 TL.  
2016 Yılı Ödeneği : 1.998.000 TL  
2016 Yılı Sonuna Kadar  
Yapılan Toplam Harcama : 0 TL.  
Fiziki Gerçekleşme : % 0  
Nakdi Gerçekleşme : % 0

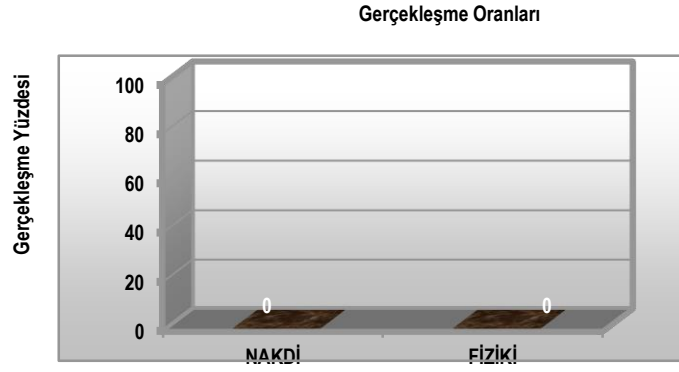

**Grafik 5:** Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin Nakdi ve Fiziki Gerçekleşmesi

**Proje No** : 2014H040000  
**Sektörü** : YÜKSEKÖĞRETİM KÜLTÜR  
**Proje Adı Özellikleri** : MUHTELİF ETÜD PROJE İŞLERİ;

1) Ankara İli Altındağ İlçesi Fevzipaşa (Ulus) Mahallesi 2576 Ada 3 Parselde Kayıtlı Taşınmazın, Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Mühendislik Projeleri Hizmet Alımı” işinin ihalesi yapılmış ve iş tamamlanmıştır.

2) Ankara İli, Çankaya İlçesi, Dikmen Mahallesinde Yer Alan Ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine Devredilen Oran Kampusü İçerisinde Bulunan Bina Ve Ortak Alanların Rölöve, Restorasyon, Uygulama, Mimarlık, Mühendislik Projeleri Hizmet Alım İşi” proje hizmet alımı devam etmektedir.

3) Ankara İli Altındağ İlçesi Fevzipaşa (Ulus) Mahallesi 2576 Ada 3 Parselde Kayıtlı Taşınmazın, Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Mühendislik Projeleri Hizmet Alımı” işinin ihalesi yapılmış ve iş tamamlanmıştır.

Proje Yeri : ANKARA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2014-2017

Proje Tutarı : 5.000.000 TL.

Önceki Yıllar Harcaması : 511.100 TL.


2016 Yılı Ödeneği : 4.488.900 TL.

2016 Yılı Sonuna Kadar

Yapılan Toplam Harcama : 1.299.110 TL.

Fiziki Gerçekleşme : % 36

Nakdi Gerçekleşme : % 27

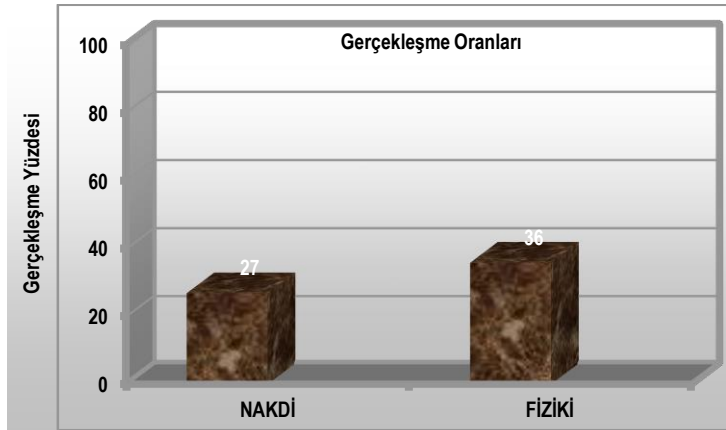

Grafik 8: Muhtelif İşler Etüd Proje İşleri Nakdi ve Fiziki Gerçekleşmesi

**Proje No** : 2014H040010

**Sektörü** : YÜKSEKÖĞRETİM KÜLTÜR

**Proje Adı Özellikleri** : TARİHİ BİNALARIN RESTORASYONU;

1) Proje kapsamında Rektörlük Hizmet Binası, Kütüphane, Kafeterya Restorasyon Uygulama İşi' nin ihalesi yapılmış ve halen restorasyon uygulaması devam etmektedir

2) Ankara ili Altındağ ilçesi Hacı bayram mahallesi 2576 ada 3 numaralı parsel, 2720 ada 52 numaralı parsellerde yer alan (I), (L) ve (M) Bloklar ile 796 ada 4 numaralı parselde yer alan Bahçenin Restorasyonu İşi" devam etmektedir

**Proje Yeri** : ANKARA

**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2014-2017

**Proje Tutarı** : 72.000.000 TL.

**Önceki Yıllar Harcaması** : 12.678.000 TL.


**2016 Yılı Ödeneği** : 21.322.000 TL.

**2016 Yılı Sonuna Kadar**

**Yapılan Toplam Harcama** : 21.316.000 TL.

**Fiziki Gerçekleşme** : % 47

**Nakdi Gerçekleşme** : % 100

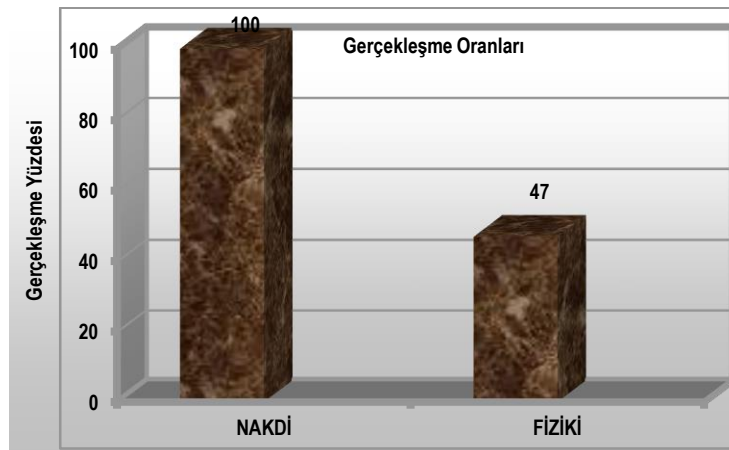

**Grafik 9: Tarihi Binaların Restorasyon Projesinin Nakdi ve Fiziki Gerçekleşmesi**

## 2.2. ÜNİVERSİTEMİZ 2016 YILI TAMAMLANAN PROJELERİ

### 2.2.1 TAMAMLANAN PROJELERİN LİSTESİ:

Proje No	Proje Adı
2016H031380	Yayın Alımı Projesi
2016H031370	Muhtelif İşler Projesi
2015H031360	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

**Proje No** : 2016H031380

**Sektörü** : YÜKSEKÖĞRETİM

**Proje Adı Özellikleri** : YAYIN ALIMİ;

Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yayın alımları tamamlanmıştır.

**Proje Yeri** : ANKARA

**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2016-2016

**Proje Tutarı** : 1.300.000 TL

**Önceki Yıllar Harcaması** : -


**2016 Yılı Ödeneği** : 1.300.000 TL.

**2016 Yılı Sonuna Kadar**

**Yapılan Toplam Harcama** : 499.700 TL.

**Fiziki Gerçekleşme** : % 38

**Nakdi Gerçekleşme** : % 38

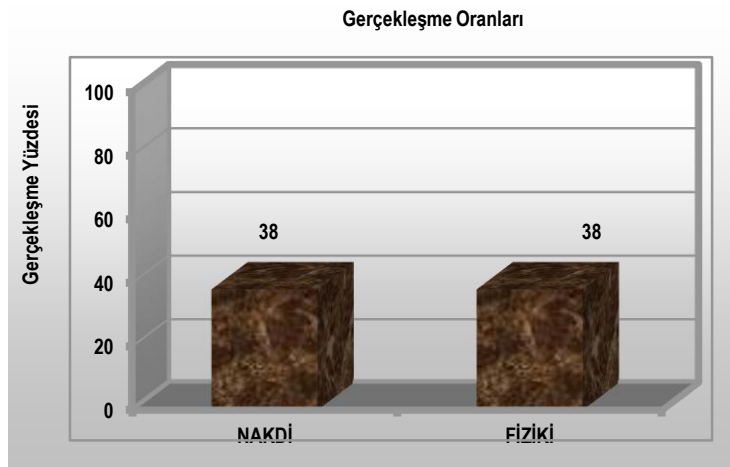

**Grafik 7: Kütüphane Yayın Alımı Projesinin Nakdi ve Fiziki Gerçekleşmesi**



**Proje No** : 2016H031370  
**Sektörü** : YÜKSEKÖĞRETİM  
**Proje Adı Özellikleri** : MUHTELİF İŞLER;

- 1) Bu proje kapsamında “Oran Kampüsü Mekanik, Elektrik, Su ve Isı İzolasyonu Gibi Acil Bakım Onarım Uygulama İşİ” yapılmıştır.
- 2) Makine ve Teçhizat ile diğer donanımların satın alma işlemleri tamamlanmıştır.
- 3) Bu proje kapsamında “Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Oran Yerleşkesi Bilişim, Elektrik, Mekanik, Otomasyon ve Zayıf Akım Sistemlerinin Dönüştürülmesi, Devreye Alınması, Bakım ve Onarımı İşİ” yapılmıştır.

**Proje Yeri** : ANKARA  
**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2016-2016  
**Proje Tutarı** : 10.610.000 TL

**Önceki Yıllar Harcaması** :-


2016 Yılı Ödeneği : 10.610.000 TL. (4.610.000 TL. likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.)

2016 Yılı Sonuna Kadar

**Yapılan Toplam Harcama** : 7.013.000 TL.

**Fiziki Gerçekleşme** : % 66

**Nakdi Gerçekleşme** : % 66

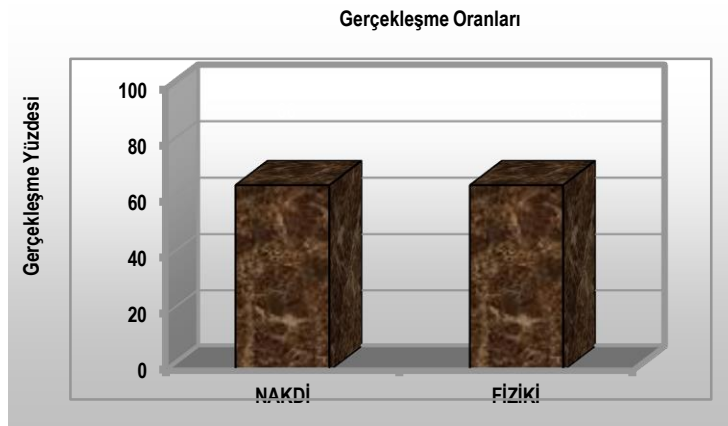


**Grafik 6: Muhtelif İşler Projesinin Nakdi ve Fiziki Gerçekleşmesi**

**Proje No** : 2016H031360  
**Sektörü** : YÜKSEKÖĞRETİM  
**Proje Adı Özellikleri** : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ;

1) Üniversitemizin, mevcut bilgi işlem sisteminde kullanılan cihazlar ile “Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası, Kütüphane, Kafeterya Restorasyon Uygulama İşi” kapsamında alımı sözleşmeye bağlanan cihazlar arasında uyumsuzlukların olduğu ve yerleşke alanına eklenen yeni binalar ile oluşan yeni kapasiteye göre bütüncül bir planlama ve uygulama yapılması gerektiği ‘Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bilgi İşlem Sistemi Tasarım ve Planlanması İşi yapılmıştır.

2) Üniversitemizin, 2017 yılı içerisinde Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği kapsamında gerçekleştireceği ihaleler ve sözleşme uygulamaları ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmeti alımı yapılmıştır.

**Proje Yeri** : ANKARA  
**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2016-2016  
**Proje Tutarı** : 200.000 TL.  
**2016 Yılı Ödeneği** : 200.000 TL. (100.000 TL. likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.)  
**2016 Yılı Sonuna Kadar**  
**Yapılan Toplam Harcama** : 175.820 TL.  
**Fiziki Gerçekleşme** : % 87  
**Nakdi Gerçekleşme** : % 87

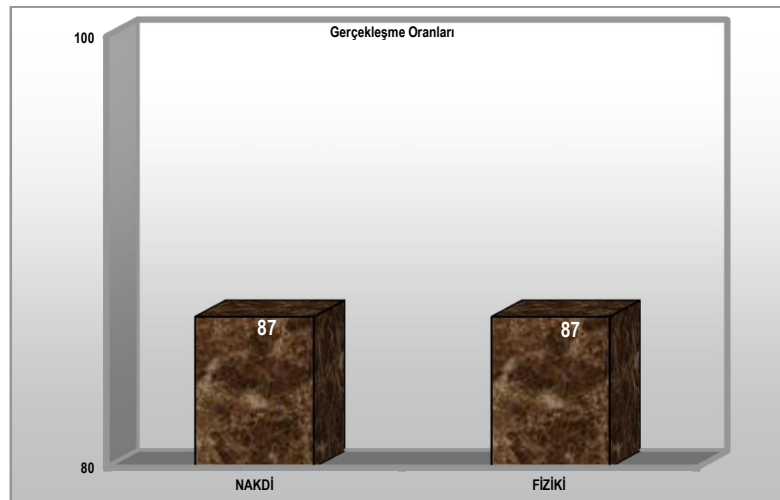

**Grafik 3: Çeşitli Ünitelerin Projesinin Nakdi ve Fiziki Gerçekleşmesi**

## 2.2.2. PROJE TAMAMLANMA RAPORU:

### PROJE TAMAMLAMA RAPORU

(BİN TL.)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2016H031360					
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi					
Sektör/Altsektör						
Proje Amacı						
Proje Yeri	Ankara					
Karakteristiği	Etüd-Proje ve Müş.					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2016					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		200			200	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2016 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2016)		176			176	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(BİN TL.)

<b>Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)</b>						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
<b>Proje No</b>	2016H031370					
<b>Proje Adı</b>	Muhtelif İşler Projesi					
<b>Sektör/Altsektör</b>						
<b>Proje Amacı</b>						
<b>Proje Yeri</b>	Ankara					
<b>Karakteristiği</b>	B.On.-Tad.-Mak.Teç.- Bil.Don.Alt.Bak.On.-İd.Yen.- Yaz.Al..					
<b>Fiziki Hedefi</b>						
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2016-2016					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>				<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>		
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		10.610			10.610	
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2016 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2016)</i>		7.013			7.013	
<b>Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>						
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b>						
<b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>						
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>						

(BİN TL.)

<b>Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)</b>						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
<b>Proje No</b>	2016H031380					
<b>Proje Adı</b>	Yayın Alımı					
<b>Sektör/Altsektör</b>						
<b>Proje Amacı</b>						
<b>Proje Yeri</b>	Ankara					
<b>Karakteristiği</b>	Kütüp.Yayın Alımı					
<b>Fiziki Hedefi</b>						
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2016-2016					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>				<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>		
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		1.300			1.300	
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2016 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2016)</i>		500			500	
<b>Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>						
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b>						
<b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>						
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>						

### 3. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİ

Üniversitemizin başta eğitim sektörü ile kültür sektörlerinde yatırım projeleri yer almaktadır. Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde başarı sağlayıcı unsurların başında kurumun mali kaynaklarının ve insan kaynaklarının yeterli kapasiteye sahip olması gelmektedir.

Yeni kurulan, yayılmasını sürdüreceği fiziki alanları en verimli şekilde kullanması gereken ve hızlı bir şekilde gelişmesine rağmen halen donanım eksikliği bulunan bir üniversite olarak, yatırım bütçelerinin oluşturulmasında kurum hedefleri göz önüne alınarak sapmaların en aza indirilmesi ve verimli ödenek kullanımının sağlanması konusunda çalışmalar yapılması mümkündür.

Üniversitenin kurum içinde rutin işlemlerinin ve kurum dışıyla olan irtibatının sağlıklı ve hızlı bir şekilde sağlanmasını gerçekleştirecek kalifiye personelin sayısının artırılması ve personelin gelişiminin sürekli kılınmasının sağlanması gerekmektedir.

Rutin bir şekilde dönem faaliyet raporları ve benzer kontrole yönelik çalışmaların yapılması yine mühim bir öneri ve tedbir olarak nitelendirilebilir.

2016 Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince mali plan ve programlar ile kurumsal plan ve programların öngördüğü çerçevede etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir. Ancak yatırım projeleri söz konusu olduğunda zamanın ve kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanımı açısından uygulamada mevzuat kaynaklı sorunlarla karşılaşabilmektedir. Özellikle kamu ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin uzunluğu, ihale sonrası ihalelere yapılan itirazların çözüme kavuşturulması, ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında tamamlanması konusunda sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sebeple ihale süreçlerine yönelik olarak mevzuatta yapılabilecek düzenlemeler ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde düzenlenmesiyle yatırımların planlanan sürede hayata geçirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir.



## 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (\*)

**Kurum Adı:** Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

**Bütçe Türü:** Özel Bütçe (Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.)

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2015 Sonu Kümülatif Harcama			2016 Yılı Program Ödenek			2016 Yılı Revize Ödenek			2016 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	7		106.900					23.700			16.810				30.303
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
<b>TOPLAM</b>	<b>7</b>		<b>106.900</b>					<b>23.700</b>			<b>16.810</b>				<b>30.303</b>

**Kuruluş Adı :ANKARA SOSYAL BİLİMLER  
ÜNİVERSİTESİ**

**2016 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME  
RAPORU**

**DÖNEM : Yıllık Değerlendirme**

**Sektör Adı :Eğitim**

**2016 Yılı Sonu Kümülatif Nakdi**

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dışı (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2015 Kümülatif Harcaması (10)	Ödenek Dışı Kredi (11)	Ödenek Dışı Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dışı Kredi (16)	Harcama Dışı Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)	
	969,	2014H040000	Muhtelif Etüd Proje İşleri	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ankara		5.000,	0,	0,	0,	1.000,	+	3.489			1.299,	
	969,	2014H040010	Tarihi Binaların Restorasyonu	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ankara		72.000,	0,	0,	0,	14.000,	+	7.322			21.316,	
	969,	2016H031360	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2016	Ankara		100,	0,	0,	0,	100,	+	100,			176,	
	969,	2016H031370	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2016	Ankara		6.000,	0,	0,	0,	6.000,	+	4.610,			7.013,	
	969,	2016H031380	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2016	Ankara		1.300,	0,	0,	0,	1.300,					499,	
	969,	2015H030380	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ankara		20.000,	0,	0,	0,	1.000,	+	998,			0	
	969,	2015H031120	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ankara		2.500,	0,	0,	0,	300,	+	300			0	
												0,						
<b>TOPLAM</b>								<b>0,</b>	<b>106.900,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>23.700,</b>		<b>16.810,</b>			<b>30.303,</b>
